25X1

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R009500200005-9

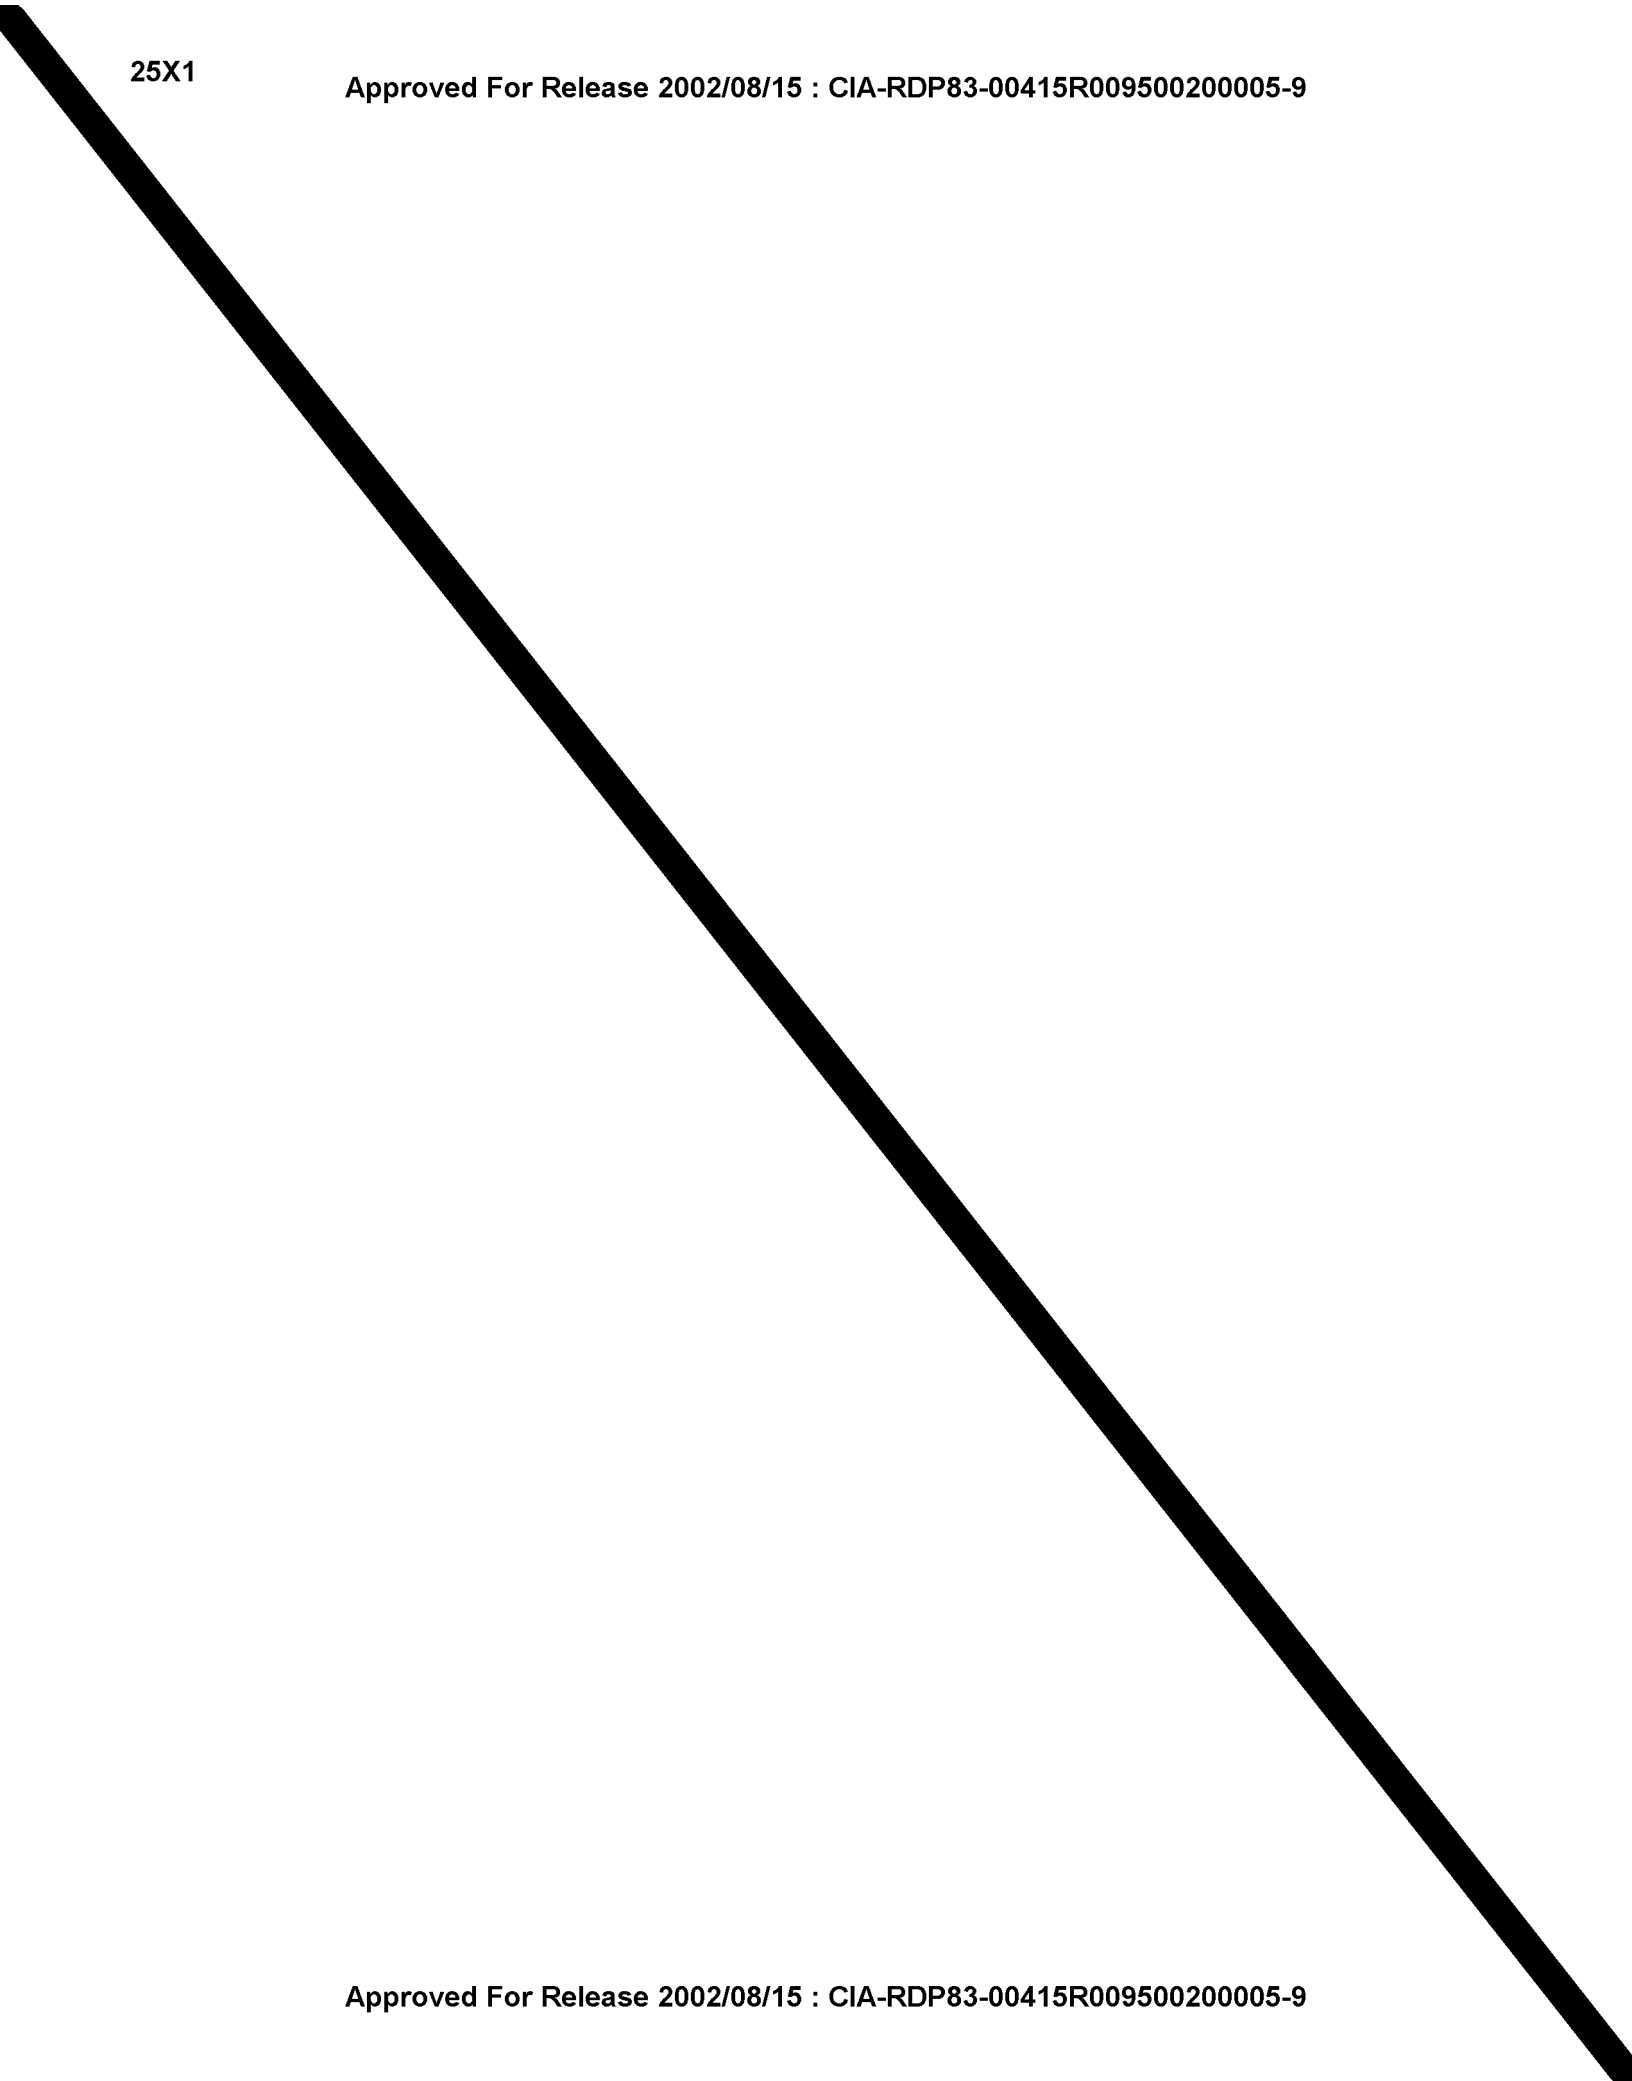

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R009500200005-9

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R009500200005-9

C 3668

CLASSIFICATION SECRET
SECURITY INFORMATION

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT NO. [ ] 25X1A

INFORMATION REPORT

CD NO.

COUNTRY Germany (Russian Zone)

DATE DISTR. 2 November 1951

SUBJECT Construction of Electric Furnaces at LEW Henningsdorf

NO. OF PAGES 1

25X1C

PLACE ACQUIRED [ ]

NO. OF ENCLS. 1 photostat (LISTED BELOW)

25X1A

DATE OF INFO: ACQUIRED [ ]

THIS DOCUMENT HAS AN ENCLOSURE ATTACHED - DO NOT DETACH

SUPPLEMENT TO REPORT NO.

25X1X

1. The attached photostat of minutes in German of a conference held on 27 April 1951 at LEW (Lokomotivbau, Elektrotechnische Werke) Hennigsdorf (VVB (Z) VEM), concerning difficulties in the construction of electrical furnaces, is sent to you on loan. Please return by 30 November 1951.

EXPLOITED BY IR

CLASSIFICATION SECRET

STATE		NAVY		NSRB		DISTRIBUTION									
ARMY		AIR				ORR	x								

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R009500200005-9

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R009500200005-9

Zentrales Konstruktionsbüro der metallurgischen Industrie VEB

Berlin, den 30.4.1951
Pl.-Kn/Sch.

N i e d e r s c h r i f t

über die Besprechung am 27.April 1951 bei LEW Hennigsdorf.

Betr.: Elektroöfen Mückenberg und Lippendorf.

Anwesend:

Herr	S t e i n ,	LEW Hennigsdorf
Herr	R e i n h a r d t ,	LEW Hennigsdorf
Herr	U l m e r ,	Ferrowerk Mückenberg
Herr	K n i t t e l ,	SKB, Berlin.

Es wurde eingehend der Liefertermin der beiden Elektroöfen 7500 kVA für Lippendorf und Mückenberg besprochen. Die Frage des Herrn Knittel nach unbedingter Einhaltung des Liefertermins dieser beiden Öfen zum 1.11.1951 wurde seitens LEW nicht eindeutig beantwortet.

Allem Anschein nach hat LEW außer internen Schwierigkeiten (Mangel an Monteuren) auch Schwierigkeiten in der fristgemäßen Anlieferung von Zubehörteilen und Materialien.

Schwierigkeiten werden auch in der rechtzeitigen Erstellung der Trafos von AEG erwartet. Die Lieferung der Gleichrichter seitens TAG wurde LEW zum 1.12.1951 angegeben, das LEW zu spät. Die Hauptverwaltung Metallurgie, Herr Wiesenau, wird gebeten, sich dieserhalb mit TAG in Verbindung zu setzen. Weiter wurde darauf hingewiesen, daß die erforderlichen Akkumulatoren und Druckölpumpen fristgemäß seien. Weitere Schwierigkeiten bestehen in der Beschaffung von Kupferguß und Buntmetallen im Gesamtgewicht von ca. 5 t.

Die Beschaffung der für das Elektrodenwindwerk erforderlichen Schiffskette (etwa 35 m für 1 Ofen) ist ebenfalls schwierig. Es werden Ketten benötigt nach Din 33 - 35, Kettengliedstärke 30 mm möglichst 35 mm. Seitens Mückenberg wird versucht werden, wenigstens einen Teil des Kettenbedarfes aus den Trümmern zu bergen. Eine diesbezügliche Mitteilung ergeht schnellstens an LEW. Ebenso wird Mückenberg ein Verzeichnis der geborgenen Profileisen an LEW zur Verarbeitung für die Elektroöfen geben.

Es wurde festgestellt, daß das erforderliche Windband für die Elektroden mit 140 mm Breite x 2 mm Dicke seitens Mückenberg und Lippendorf beschafft werden muß. Ausgangsmaterial für die Bänder sind 2 mm starke Bleche. Diese Bleche werden in 140 mm breite Bänder geschnitten, die in Schwalbenschwanzformat stumpf aneinander geschweißt werden.

Koll. Müller von EVW Leipzig hatte gebeten, Erkundigungen nach dem Stand des 15 t Ofens für Kosswig und des 10 t Ofens für Quedlinburg einzuziehen. Der Ofen für Kosswig ist bestellt, wird am 1.4.1952 geliefert, so daß die Inbetriebnahme am 30.6.1952 erfolgen kann.

Der Ofen für Quedlinburg ist noch nicht bestellt. Diese Feststellung wurde bereits telegrafisch an den Koll. Müller, EVW, weitergegeben.

Knittel.

Verteiler:
LV Metallurgie, Herren Wiesenau/Müller
[illegible] Mückenberg

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R009500200005-9
